


# Kommentarer generellt

- Ny redovisningsmetod med hjälp av webbaserat projektverktyg ,Webforum, ger bättre överblick och möjlighet till rapporter. Vi ser stora fördelar med att använda samma verktyg för samtliga projekt då vi kan få en samlad redovisning. Implementering fortsätter.
- Ny projektledare anläggning sedan 1 september är Heng-Sun Chung
- Entreprenadpriser fortsätter öka men ökningen verkar mattas något. Redovisning planeras månadsvis i fortsättningen.



# Investeringsprojekt TSN

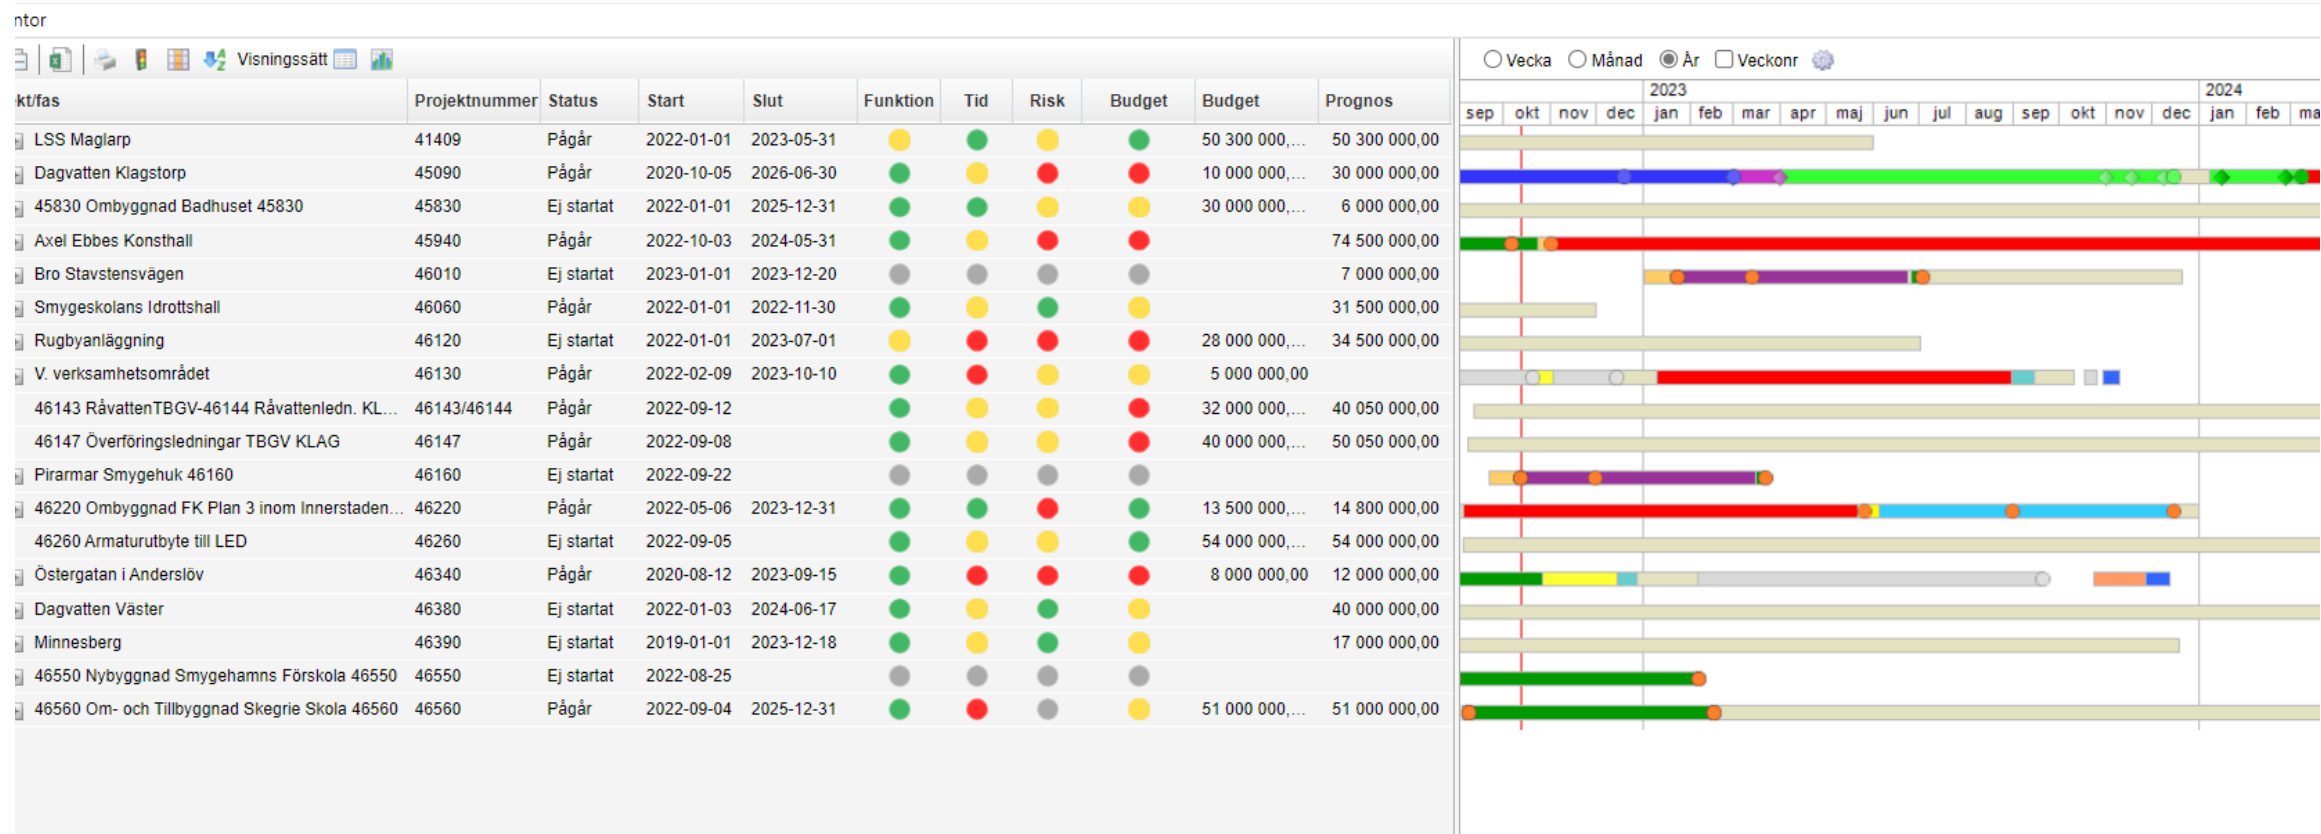

TRELLEBORGS KOMMUN

# Avslutade projekt

- 45860 Brosjödals ridklubb
- 45860 Kyrkoköpinge ridklubb
- 46490 Ersättning konstgräsplan Köpingseskolan, finansieras i stället i Kultur- & Fritidsförvaltningens budget.



# Nya projekt

- 45830 Ombyggnad badhus, avser nu endast underhållsinvestering för att säkerställa drift.
- 46143 Råvattenledningar till vattenverk
- 46147 Överföringsledning vatten mellan vattenverk Klagstorp och Trelleborg.
- 46260 Armaturutbyte till LED avs. gatubelysning
- 46550 Nybyggnad Smygehamns Förskola
- 46560 Om- och tillbyggnad Skegrie skola



# Kommentarer

- 41409 Osäkert om säkerhetsglas håller rätt energikrav
- 45090 Dagvattenutbyggnad Klagstorp. Utökad budget inte säkerställd, svårigheter med servitutsavtal med markägare
- 45940 Axel Ebbes konsthall, uppdaterad budget 74 500 000, projektet flyttas fram minst 12 månader.
- 46060 Smygeskolans idrottshall, försening pga. sen leverans fönster och dörrar, ca 1,5 MSEK över budget.



# Kommentarer

- 46120 Rugbyanläggning, tilldelningsbesked utskickat, utsedd entreprenör Gräsmiljö Sverige AB, budget beräknas överskridas med ca 4,5 MSEK. Tidigare upphandling avbröts och konceptet arbetades om till traditionell gräsplan.



# Kommentarer

- 46130 Västra Industriområdet, tidplan något förskjuten pga ökad omfattning
- 46220 Ombyggnad FK plan 3 inom Innerstaden 5:47, risk för saneringskrav i byggnad.
- 46260 Armaturutbyte till LED, 9000+ belysningspunkter, upphandling förlängd till slutet oktober, risk avser genomförandetid, materialkvalitet och kostnader



# Kommentarer

- 46340 Ombyggnad Östergatan Anderslöv. Projektering återupptagen, osäkert om tidplan kan hållas, risk för förorenade massor, vibrationsskador på byggnader och ökade kostnader
- 46380 Dagvatten väster, osäkerhet kring tider och kostnader.
- 46390 Minnesberg kommunalt avlopp, osäkerhet kring tider och kostnader, kalkyl från 2021.
- 46560 Om- och tillbyggnad Skegrie skola, önskad tid fr. verksamhet bedöms ej rimlig, oklarhet kring budget

