

Investeringsprojekt

Uppföljningsrapport 2023-02-08




TRELLEBORGS KOMMUN

Kommentarer generellt

- Entreprenadindex t.o.m. december är nu färdiga. Vi ser här vad som verkar vara ett trendbrott. Entreprenadpriser fortsätter öka men ökningstakten vänder tydligt nedåt för samtliga kategorier utom konsult. Konsumentprisindex fortsatte uppåt och ökningstakten för 12 mån var 13,3 %.
- Rekrytering pågår av entreprenadupphandlare med fysisk placering på Tekniska Serviceförvaltningen. Funktionen kommer vara ett specialiserat stöd dels vid objektspecifika upphandlingar, dels vid upphandling av ramavtal för entreprenad och tekniska konsulter.




Entreprenadindex 100 Husbyggnadsentreprenad

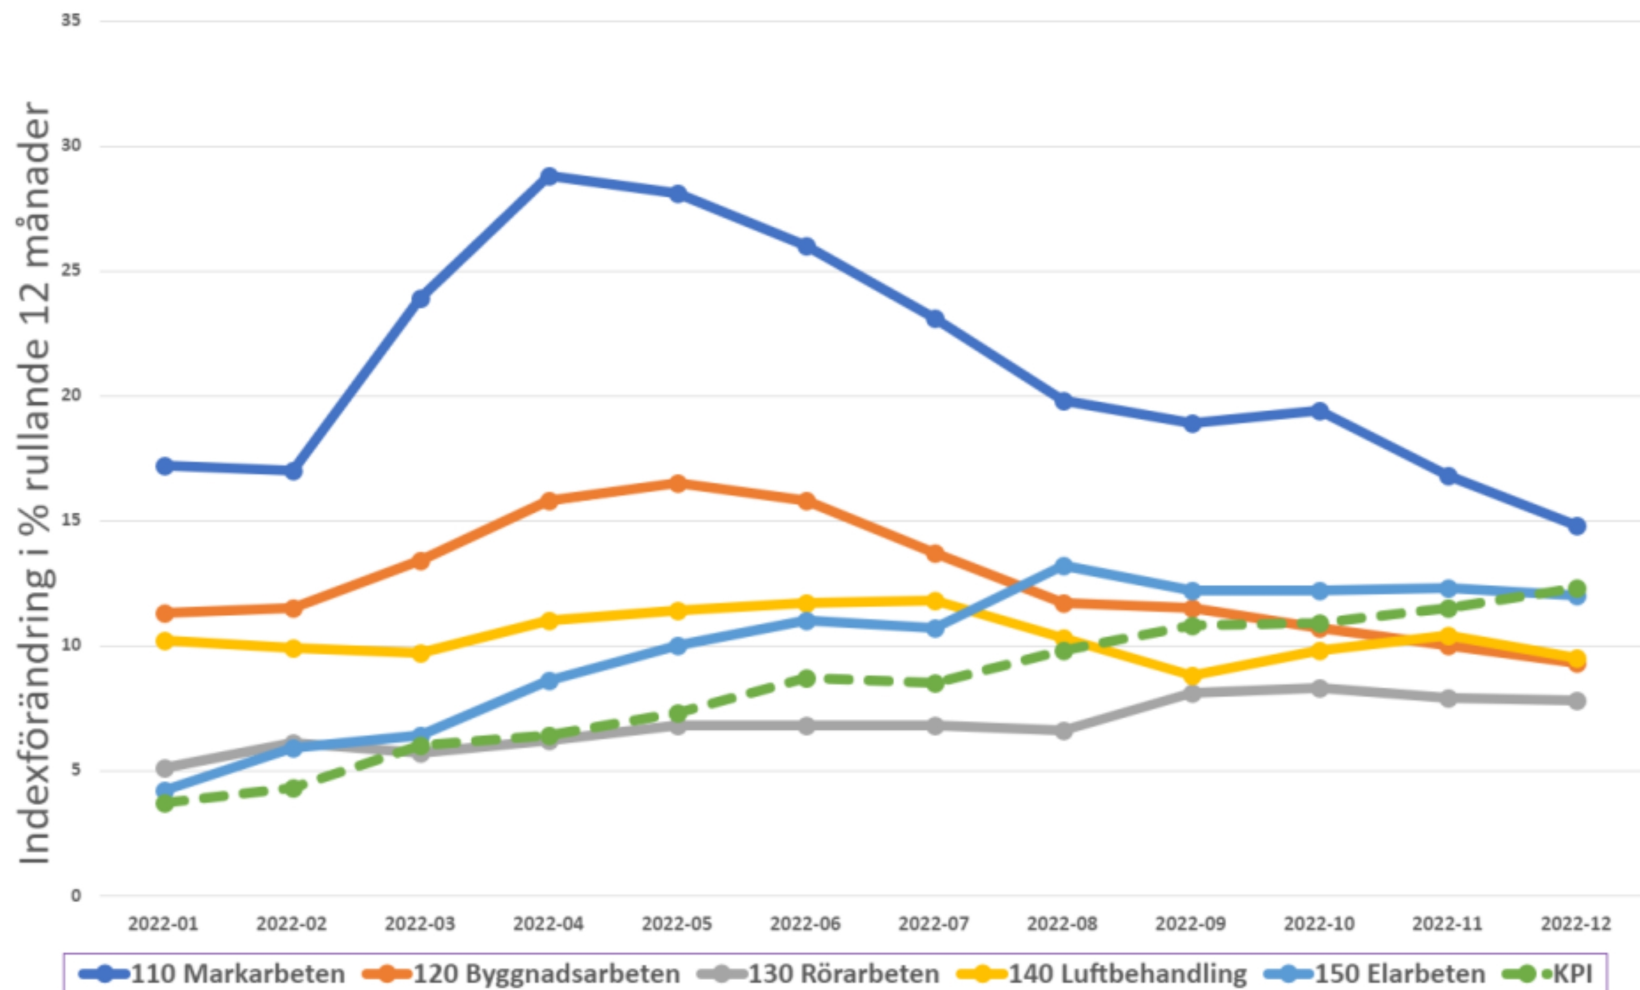


TRELLEBORGS KOMMUN

Entreprenadindex 200 Vägentreprenader

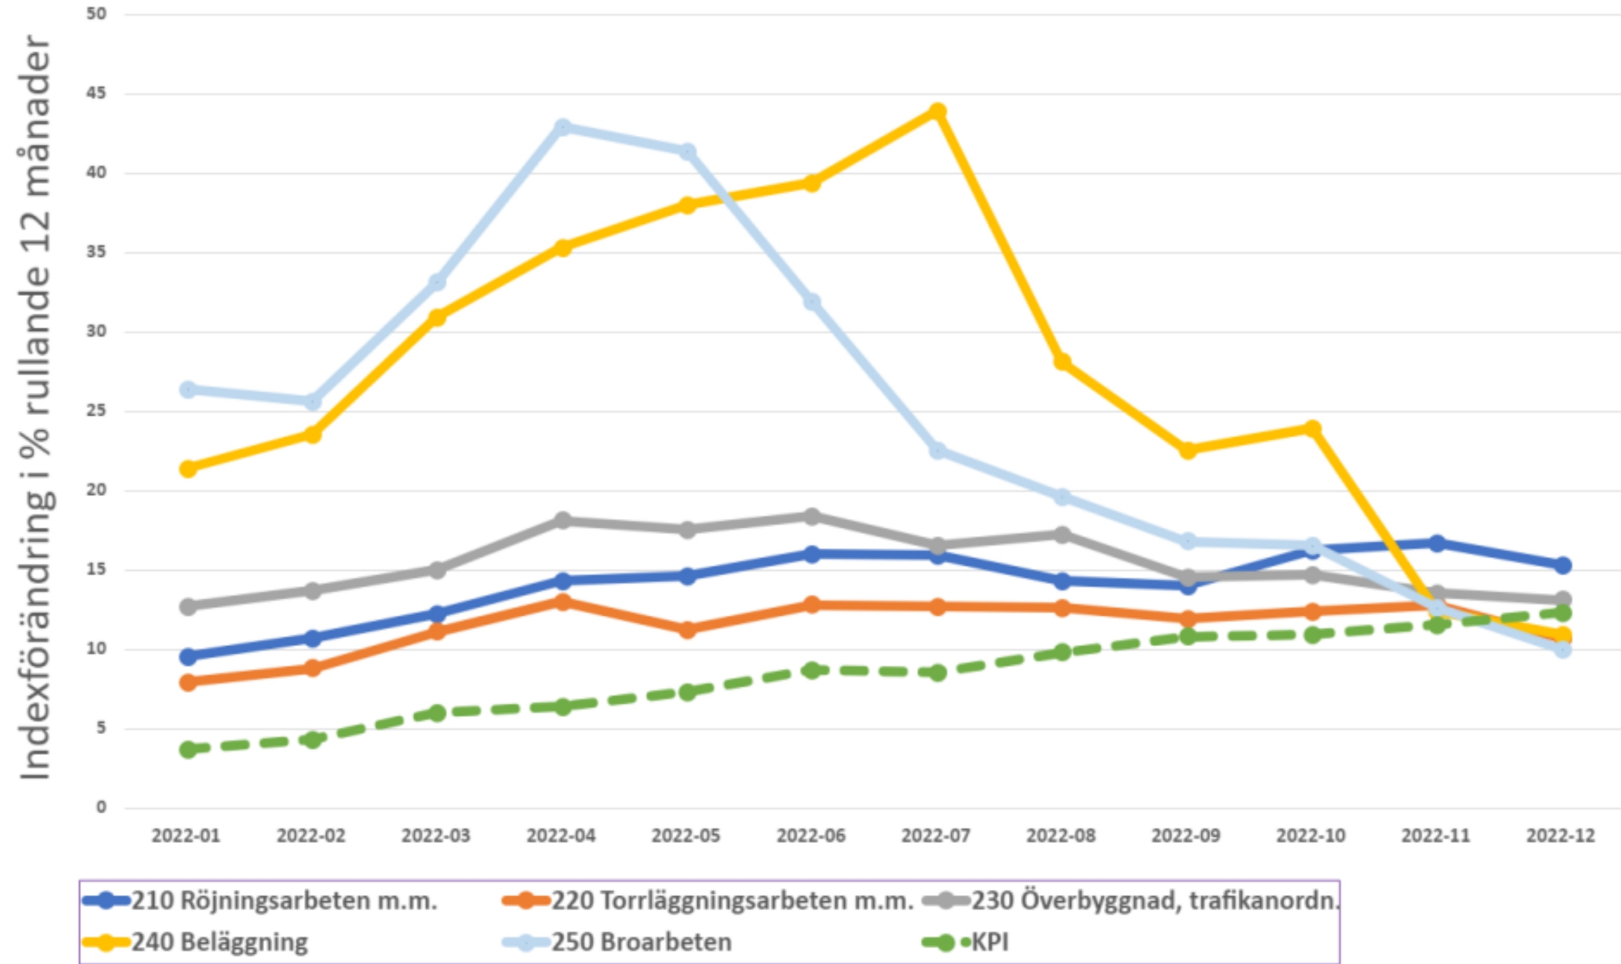

TRELLEBORGS KOMMUN

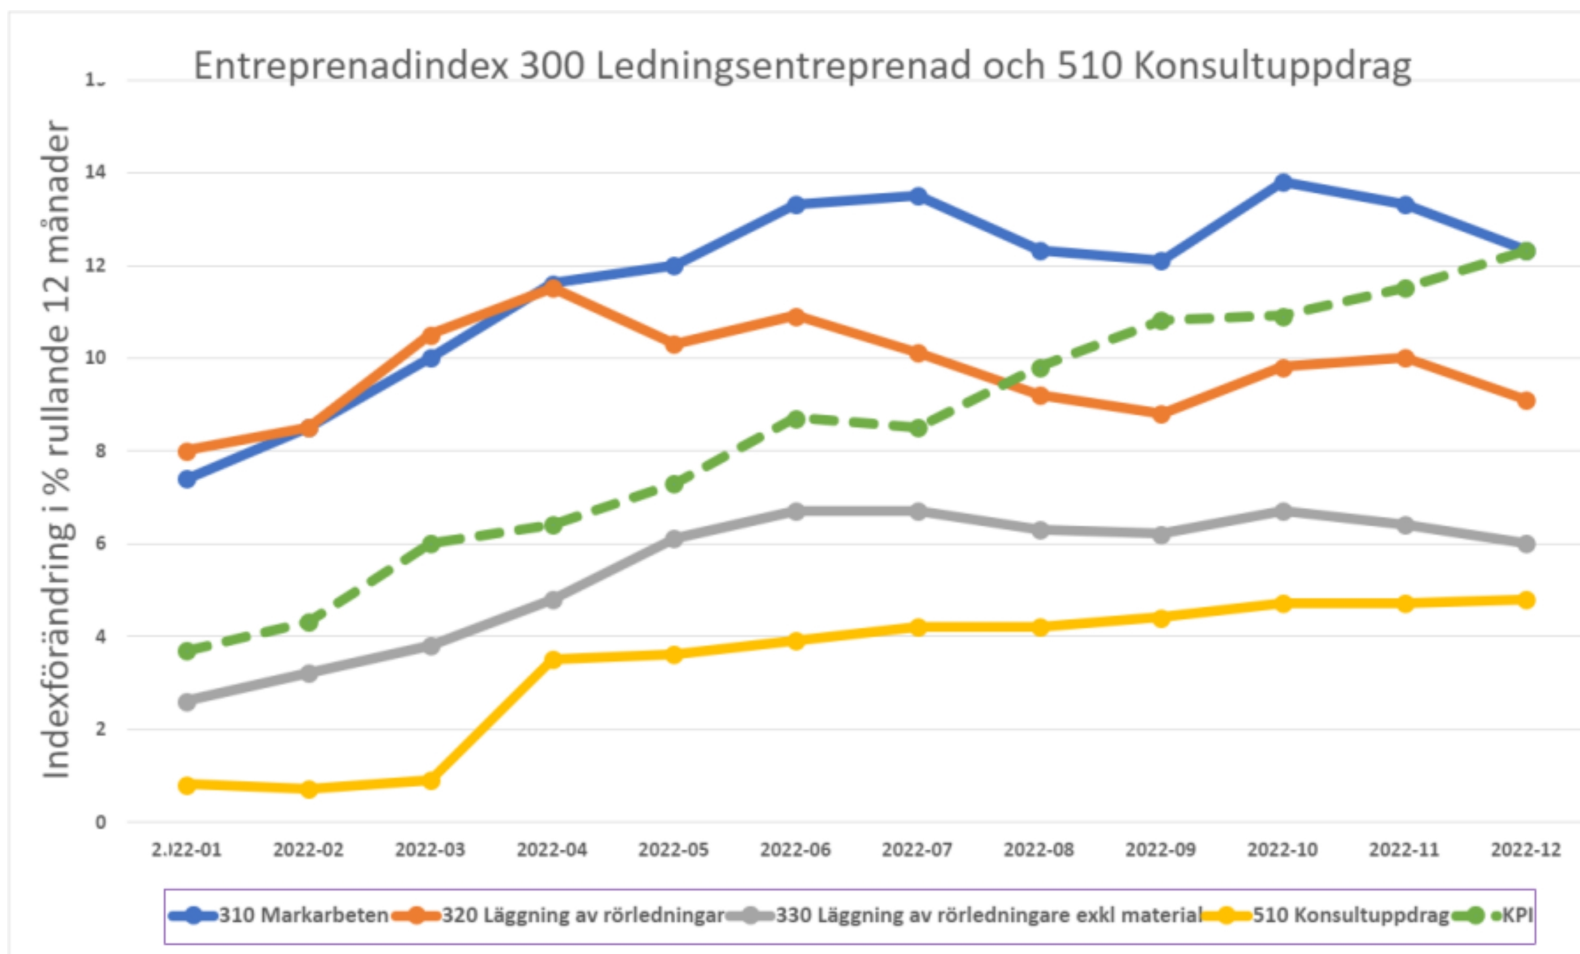


TRELLEBORGS KOMMUN

Investeringsprojekt TSN

Trelleborg

Välj projekt ▾

Projektkontor

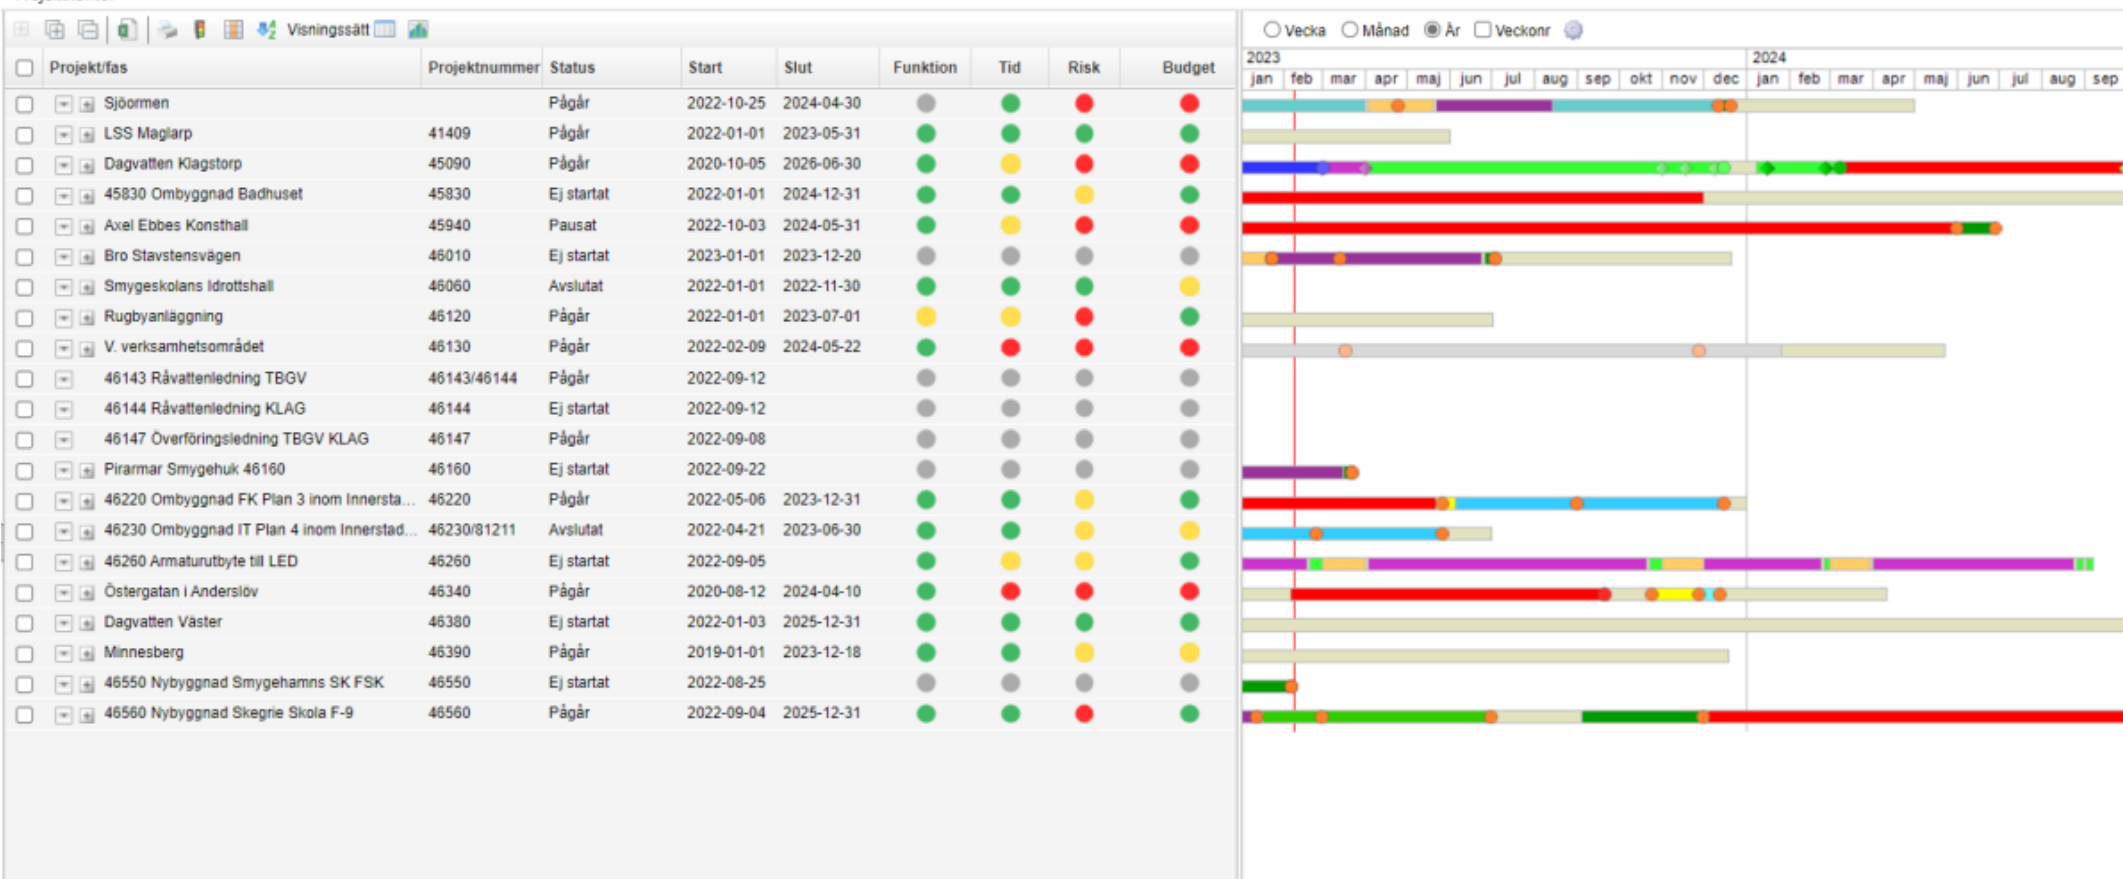

TRELLEBORGS KOMMUN

Känslighet: Verksamhetsinformation

Avslutade projekt

- 46230 Ombyggnad IT Plan 4 inom Innerstaden 5:47



Nya projekt

- Sjöormen, renovering av befintlig fontän, se separat beskrivning.



Kommentarer

- 41409 LSS Maglarp, tillägg solceller beräknas rymmas inom budget
- 45090 Dagvattenutbyggnad Klagstorp, förstudie, utökad budget inte säkerställd, svårigheter med servitutsavtal med markägare.
- 45830 Ombyggnad Badhuset, ej startat, avser endast nödvändig investering för att säkra fortsatt drift.
- 46010 Bro Stavstensvägen, ej startat, utförs under 2023.
- 46070 Vattenverksvägen Smygehamn, avslutande arbeten toppbeläggning mm våren 2023.



Kommentarer

- 46120 Rugbyanläggning, utsedd entreprenör Gräsmiljö Sverige AB, viss osäkerhet kring när gräset är tillräckligt etablerat för spel
- 46130 Västra Industriområdet, projektering, ökad omfattning medför ändrad tid och ökade kostnad. Fortsatt arbete med att anpassa omfattning till budget.
- 46143 Råvattenledningar till vattenverk Trelleborg, förstudie pågår.



Kommentarer

- 46144 Råvattenledning till vattenverk Klagstorp, förstudie påbörjad.
- 46147 Överföringsledning vatten mellan vattenverk Klagstorp och Trelleborg. Förstudie påbörjad
- 46160 Pirarmar Smygehuk, ej startat.
- 46220 Ombyggnad FK plan 3 inom Innerstaden 5:47,
- 46260 Armaturutbyte till LED, 9000+ belysningspunkter, Upphandling avbruten, ny upphandling förbereds.



Kommentarer

- 46340 Ombyggnad Östergatan Anderslöv. Projektering återupptagen, omfattning är inte helt fastslagen
- 46380 Dagvatten väster, förstudie.
- 46390 Minnesberg kommunalt avlopp, upphandling förbereds, osäkerhet kring tider och kostnader, kalkyl från 2021, djup schakt i gammal bruksort.
- 46550 Nybyggnad Smygehamns Förskola, ej startat
- 46560 Om- och tillbyggnad Skegrie skola, projektering pågår, sannolikt markföroreningar.



Sjöormen

Konstnär Axel Ebbe

Invigd 1935

Senast renoverad 1996

Projektledare för renovering
Urban Nordh Oppicon AB



TRELLEBORGS KOMMUN

Sjöormen

- Renovering av fontän pga. stort vattenläckage. Omfattning avser både bassäng och teknik som moderniseras för att motsvara dagens standard och krav avseende arbetsmiljö mm. Teknisk livslängd har uppnåtts. Teknikutrymme i mark fördjupas för ståhöjd. Belysning kompletteras. Endast konstverket lämnas utan åtgärd.
- Driftsättning planeras till våren 2024
- Budget är osäker och medel för genomförande äskas när kalkyl är klar.
- Aktuella risker: brister i tidigare dokumentation, föroreningar i mark, geotekniska förhållanden
- Projektering för totalentreprenad pågår.

